O Mito do Modelo Cascata

Aula 05

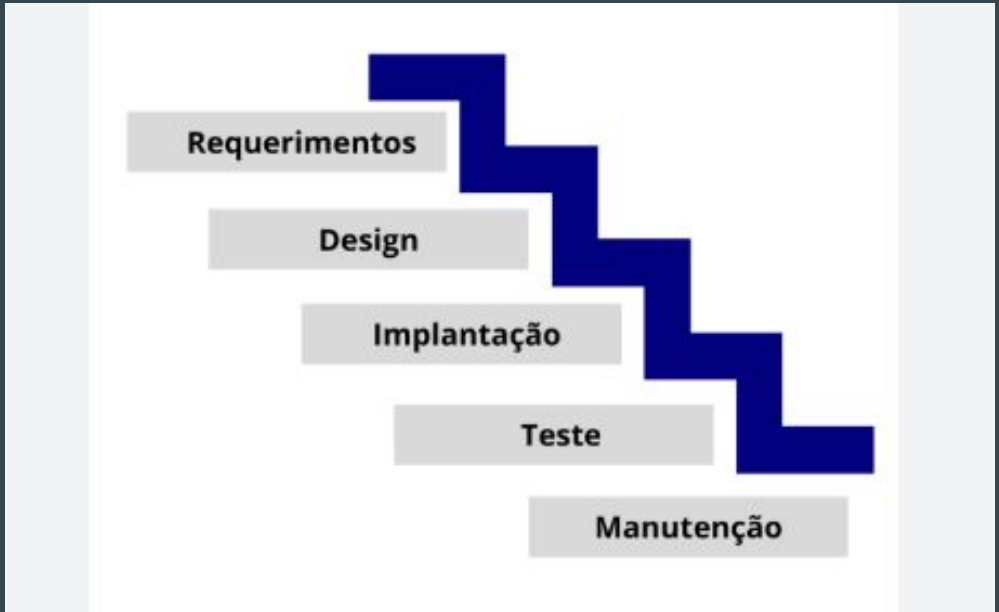

"A Reunião" – Onde os Projetos Começam a Morrer

•••

O Cenário: Uma data final fixa (1º de novembro) sem nenhum requisito definido.

O Erro Fatal: Tentar encaixar o desconhecido em um cronograma rígido.

A Pressão: O uso de autoridade para forçar estimativas irreais ("Finjam que têm os requisitos!").

Estimativas Fictícias vs. Realidade

O Perigo de "Fingir" Requisitos

A Armadilha do Cronograma: O gestor não quer uma data real, ele quer "algo para colocar no papel".

A Consequência:

- Estimativas baseadas em nada geram prazos impossíveis.
- A equipe começa o projeto já sob estresse e em dívida.

O ultimato: *"Se demorar mais de dois meses, nem pegamos o projeto"* — Isso força a equipe a mentir para viabilizar o trabalho.

Por que o Modelo Cascata Falha aqui?

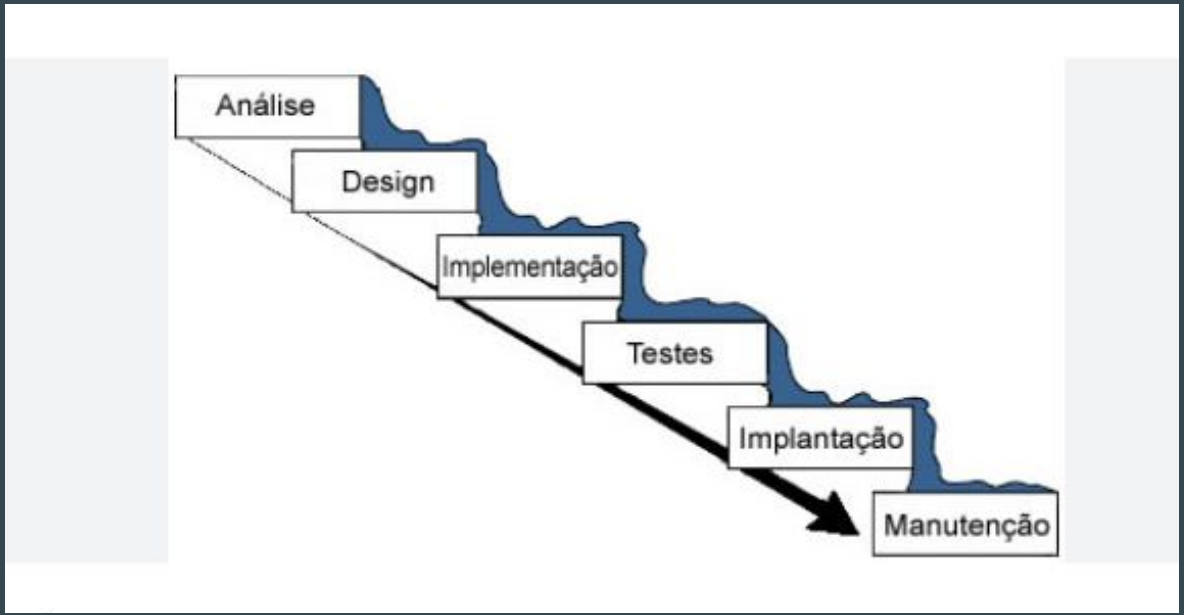

Cascata: Linearidade em um Mundo Caótico

O pressuposto errado: A ideia de que podemos prever o futuro perfeitamente (Análise → Requisitos → Design → Código).
O problema da comunicação: O "chefão" ignora que requisitos são descobertos, não inventados.
O que o Ágil faria diferente?

- Em vez de um cronograma fixo de 6 meses, faria uma entrega mínima (**MVP**) em 2 semanas.
- Os requisitos seriam refinados conforme o sistema ganhasse vida.

Conclusão Pragmática

Lições para o Desenvolvedor

- **Seja Profissional:** Ser profissional não é "dar qualquer data", é alertar sobre os riscos de estimar no escuro.
- **Dados sobre Palpites:** Use o histórico da equipe (velocidade) para basear prazos, não o grito do gestor.
- **O Papel do Framework:** O Ágil protege o projeto dessa "Reunião" ao admitir que os requisitos vão mudar.
